

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682860, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Межселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучукей-Дуа, строение 6
тел. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTU@portalliance.ru



ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 40702810400000016190
Банк ГПБ АО г. Москва
К/с 30101810200000000823 БИК 044525823

Исх № 23/1882 от 10.07.2026

Генеральному директору
ООО «Радиан»

Труфанову В.Н.

«О направлении актов фиксации остановки работ»

Уважаемый Валерий Николаевич!

Между АО «Дальтрансуголь» и ПО «Радиан» заключен Договор подряда №ДТУ-23/ЗУ от 17.01.2023г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений из производственной зоны» и Договор №ДТУ-25/1911 от 20.10.2025г. на укладку наружных сетей канализации К1, К3, водоснабжения В1 на объекте Здание бытовых помещений ремонтной зоны; наружных сетей канализации К4, К3, водоснабжения В2 на объекте ПС-1.1» в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки угля АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн в год».

Направляем в Ваш адрес акты фиксации остановки работ.
Представитель ООО «Радиан», находящийся на территории АО «Дальтрансуголь» от подписи отказался.

С уважением,
Руководитель проекта

И.Э. Яковлев

АКТ
осмотра по выполнению работ по договору подряда
№ ДТУ-23/3У от 17.01.2023

682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, Межселенные территории Ванинского муниципального района, территория Мыс Мучукей-Дуа,

«09» июля 2026

Время составления акта: 15 час. 00 мин.

Комиссия в составе:

1. Червонный Андрей Владимирович, зам. исполнительного директора по безопасности АО «Дальтрансуголь»
2. Яковлев Игорь Эдуардович, руководитель проекта КИП-40 АО «Дальтрансуголь»
3. Пискарев А.А., главный специалист отдела по КС КИП40 АО «Дальтрансуголь»
4. Злочевский М.А. - представитель ООО «Радиян».

В ходе проведения осмотра комиссией по работам, выполненным ООО «Радиян» по Договору подряда №ДТУ-23/3У от 17.01.2023г., установлено, что работы полностью остановлены с 22.06.2026г. а также зафиксировано что:

1. Не выполнена обратная засыпка уложенных трубопроводов на участке от ВК151 в сторону ВК152.
2. Не выполнена укладка трубопровода сети В1, В2 на участке от УГ10 в сторону ВК147.
3. Не выполнена обратная засыпка разработанной траншеи на участке от ВК1` в сторону ВК147.
4. Не выполнены работы по укладке трубопровода В2 на участках от УГ 22 (+94,6 метра) до ВК-553, от УГ21 (+49,2 метра) до ВК-550.
5. Не выполнены работы по разработке грунта, укладке трубопроводов, устройству водопроводных колодцев на участках от ВК1`(+35 метров) до ВК150, УГ1 до ВК251.
6. Не выполнены работы герметизации колодцев №ВК2`, ВК3`, ВК4`, ВК5`, ВК6`, ВК7` ВК8/1, ВК9`, ВК10, ВК10/1, ВК10/2, ВК11`, ВК12`, ВК12/1`, ВК12/2, ВК13, ВК13`.

На момент проверки рабочий персонал ООО «Радиян» на объекте отсутствовал.


Подписи членов комиссии:

1. _____ /Червонный А.В.
2. _____ /Яковлев И.Э.
3. _____ /Пискарев А.А.
4. _____ /Злочевский М.А.

С актом ознакомлен (или "от подписи отказался"):

_____/_____/_____
(подпись представителя подрядчика, с указанием доверенности)



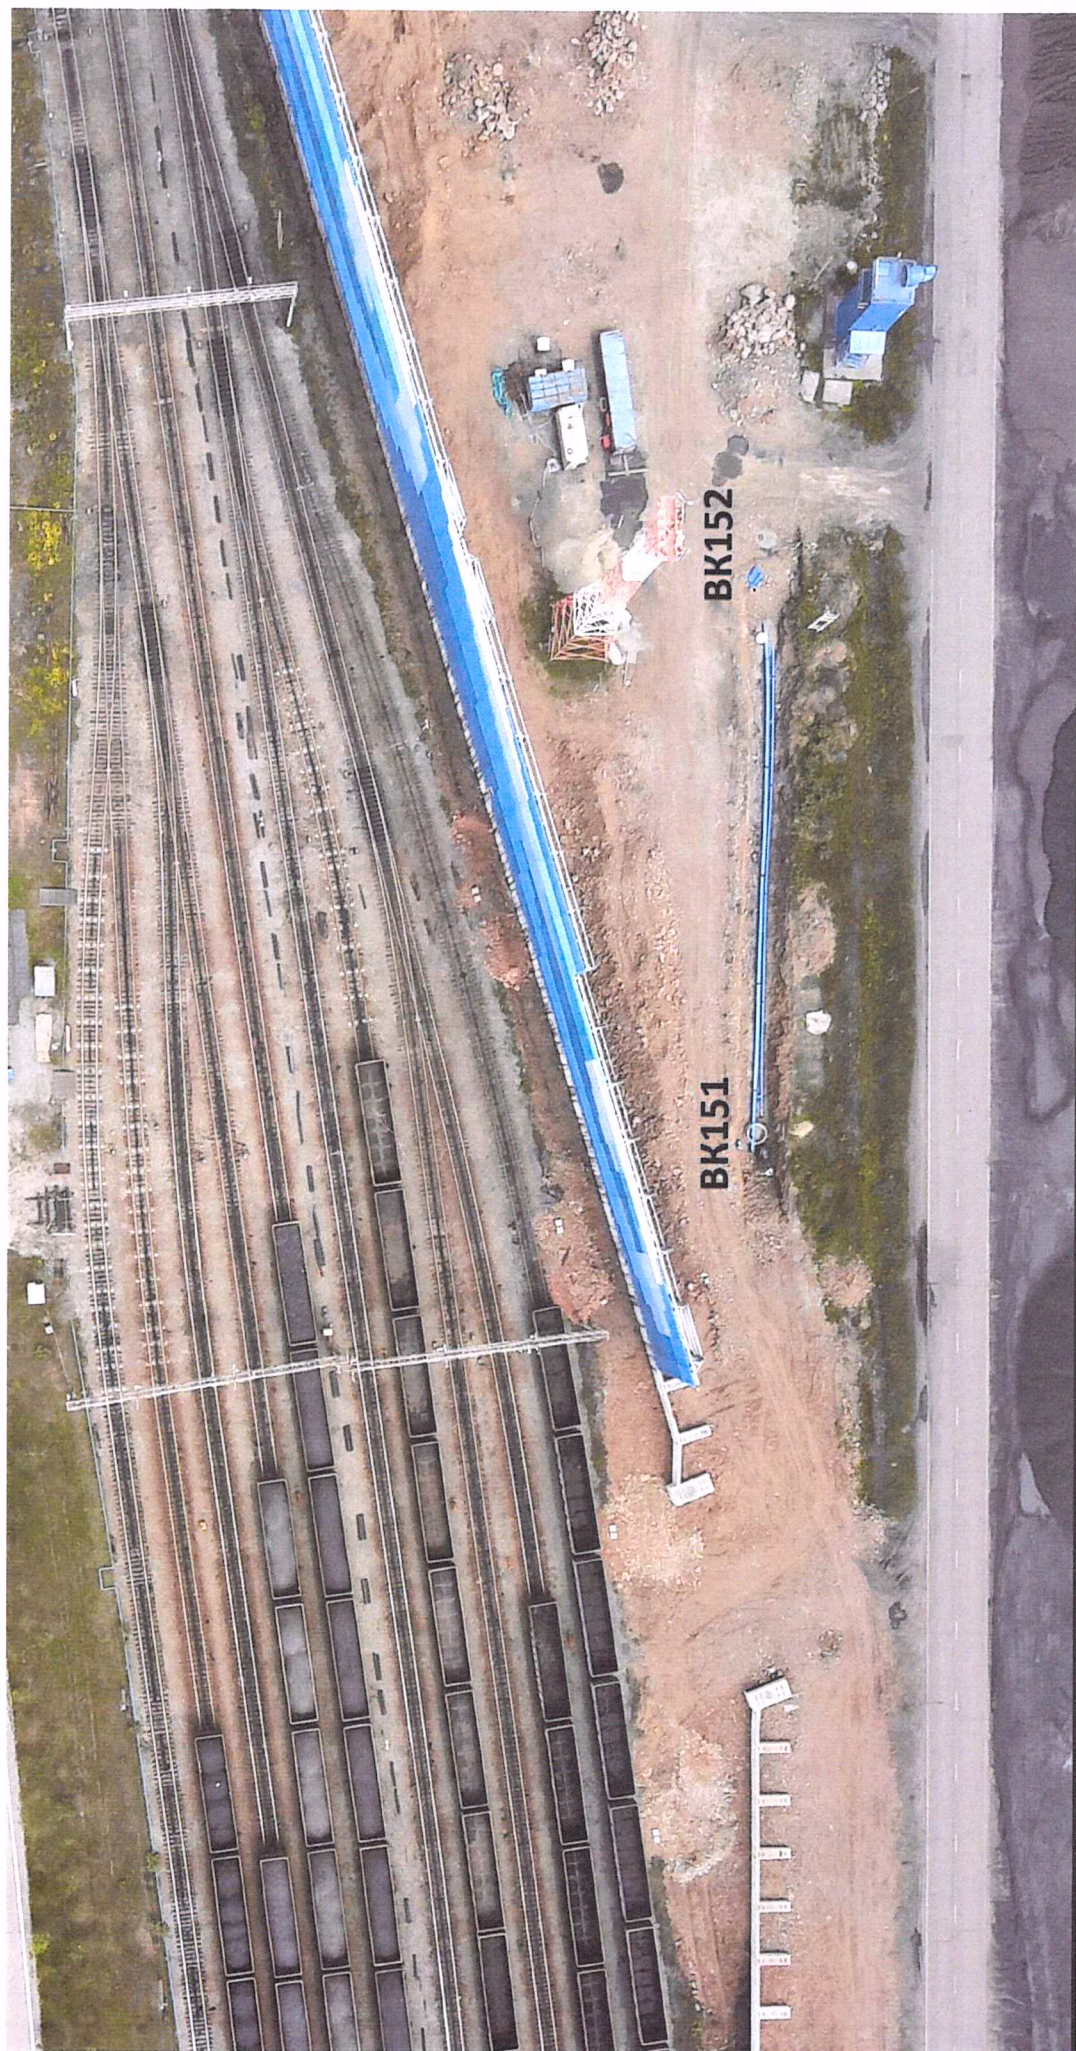



БК1

УГ10



АКТ
осмотра по выполнению работ по договору подряда
№ ДТУ-25/1911 от 20.10.2025г.

682860, Российская Федерация, Хабаровский
край, Ванинский муниципальный район,
Межселенные территории Ванинского
муниципального района, территория Мыс
Мучукей-Дуа,

«09» июля 2026

Время составления акта: 15 час. 00 мин.

Комиссия в составе:

1. Червонный Андрей Владимирович, зам. исполнительного директора по безопасности АО «Дальтрансуголь»
2. Яковлев Игорь Эдуардович, руководитель проекта КИП-40 АО «Дальтрансуголь»
3. Пискарев А.А, главный специалист отдела по КС КИП40 АО «Дальтрансуголь»
4. Злочевский М.А. - представитель ООО «Радиян».

В ходе проведения осмотра комиссией по работам, выполненным ООО «Радиян» по Договору подряда №ДТУ-25/1911 от 20.10.2025г., установлено, что работы полностью остановлены с 29.06.2026г. а также зафиксировано что:

1. Не выполнена герметизация ж/б колодцев ВК1.2, КК1.1, КК2.1 система К1 неработоспособна. Необходимо выполнить выемку грунта, откачку воды, просушку и герметизацию всех колодцев, а также стыков безнапорного трубопровода.
2. Не закончен монтаж накопительной емкости в проектную отметку.
3. Не выполнена обратная засыпка траншеи.

На момент проверки рабочий персонал ООО «Радиян» на объекте отсутствовал.

Подписи членов комиссии:

1. _____ /Червонный А.В.
2. _____ /Яковлев И.Э.
3. _____ /Пискарев А.А.
4. _____ /Злочевский М.А.

С актом ознакомлен (или "от подписи отказался"):

_____/_____/_____
(подпись представителя подрядчика, с указанием доверенности)

